

保育所整備計画に係る進捗状況について

1 岡本保育園園舎建替え

○ 概要

鎌倉市立岡本保育園は、平成 24 年度中に行った耐震診断の結果を受けて建替え工事を行っており、たまなわ児童遊園に設置した仮設園舎で運営を行っています。現在は園舎の内装工事を行っており、10 月 1 日に引渡しを受け、引っ越し後 10 月 13 日から保育を行う予定となっています。園舎の建替えに当たっては、定員を現在の 90 人から 10 人増やして 100 人とするほか、強い市民ニーズを受けて一時預かり事業を新たに実施する予定です。



(参考) スケジュール (予定)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
仮設園舎	保育園運営						引越 し			
新園舎	建設							準備等	保育園運営	
	竣工検査 引渡し (10/1)									

2 (仮称) 明照フラワーガーデン保育園

○ 概要

(仮称) 明照フラワーガーデン保育園は、平成 26 年 3 月に神奈川県から借用した県立フラワーセンター大船植物園苗ほ跡地にて、社会福祉法人つきかけ会が保育所を整備しています。現在建築工事を行っており、平成 27 年度中の開所を予定しております。定員は 90 人となっておりますが、開園に伴い当該法人が運営する岩瀬保育園植木分園を閉園する予定であり、植木分園の定員である 36 人を受け入れる形になるため、54 人の定員増となります。また、強い市民ニーズがある一時預かり事業を新たに実施する予定です。



(参考) スケジュール (予定)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設										保育園運営	

竣工検査・引渡し

3 聖アンナの園園舎建替え

○ 概要

社会福祉法人カリタスの園が運営する認可保育所聖アンナの園は、1966年(昭和41年)に現在の園舎が完成しました。完成から49年経ち、建物の老朽化が著しく、地震への備えとして園舎の建替えを行う予定となっています。平成27年度から28年度にかけての事業であり、工程としては平成27年度の10月頃から現園舎の敷地内に新園舎の新築工事を行う予定です。

なお園舎の建替えに当たっては、定員を現在の140人から150人へ増員する予定となっています。



(参考) スケジュール (予定) H28

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
解体工事		解体										解体			
新築工事			建設							引越					外構

竣工検査


4 (仮称) 由比ガ浜こどもセンター内保育所

○ 概要

鎌倉市立材木座保育園及び鎌倉市立稲瀬川保育園を津波や施設老朽化への対策として移転させるとともに、子育て支援センター、障害児等放課後余暇施設との複合施設として、(仮称) 由比ガ浜こどもセンターの建設を進めているところです。

現在は基本設計が概ね終わった段階であり、今後発掘調査を行い、平成 28 年 3 月頃から着工し平成 28 年度中にかけて工事をを行い、(仮称) 由比ガ浜こどもセンター内保育所については、平成 29 年 4 月に開所する予定です。

当該施設は、材木座保育園と稲瀬川保育園の統合園として 180 人定員を設定するほか、強い市民ニーズを受けて一時預かり事業を新たに実施する予定です。

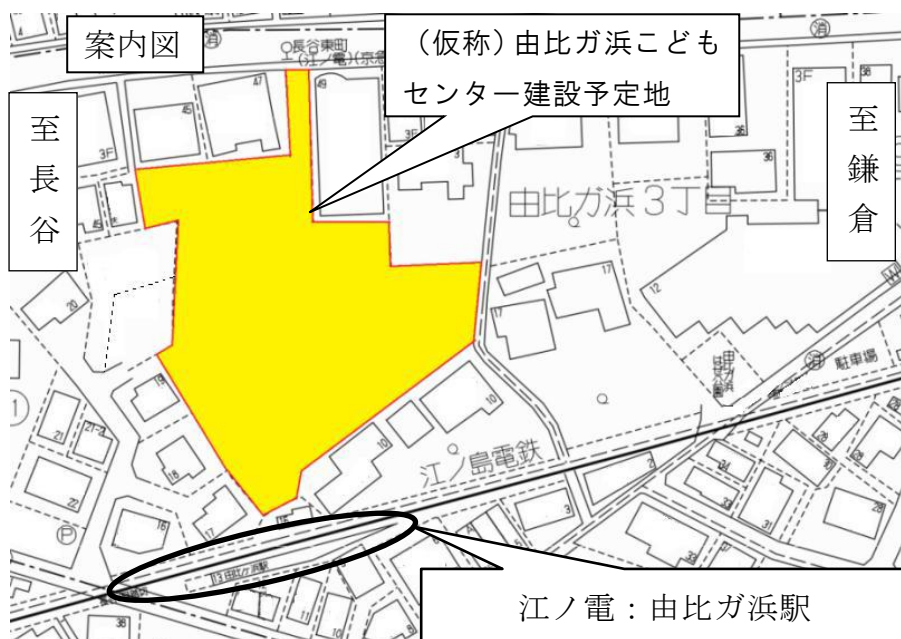

(参考) スケジュール (予定)

H28							H29				
~8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	~	3月	4月	~
設計											
発掘調査 (時期未定)							建設工事		保育園運営		
